
Q2 / R2211 / 1P – Messkontakte

Pausenstand 09.11.2026 · Diodentest ausstehend · B/C/E nur Kandidatenzuordnung

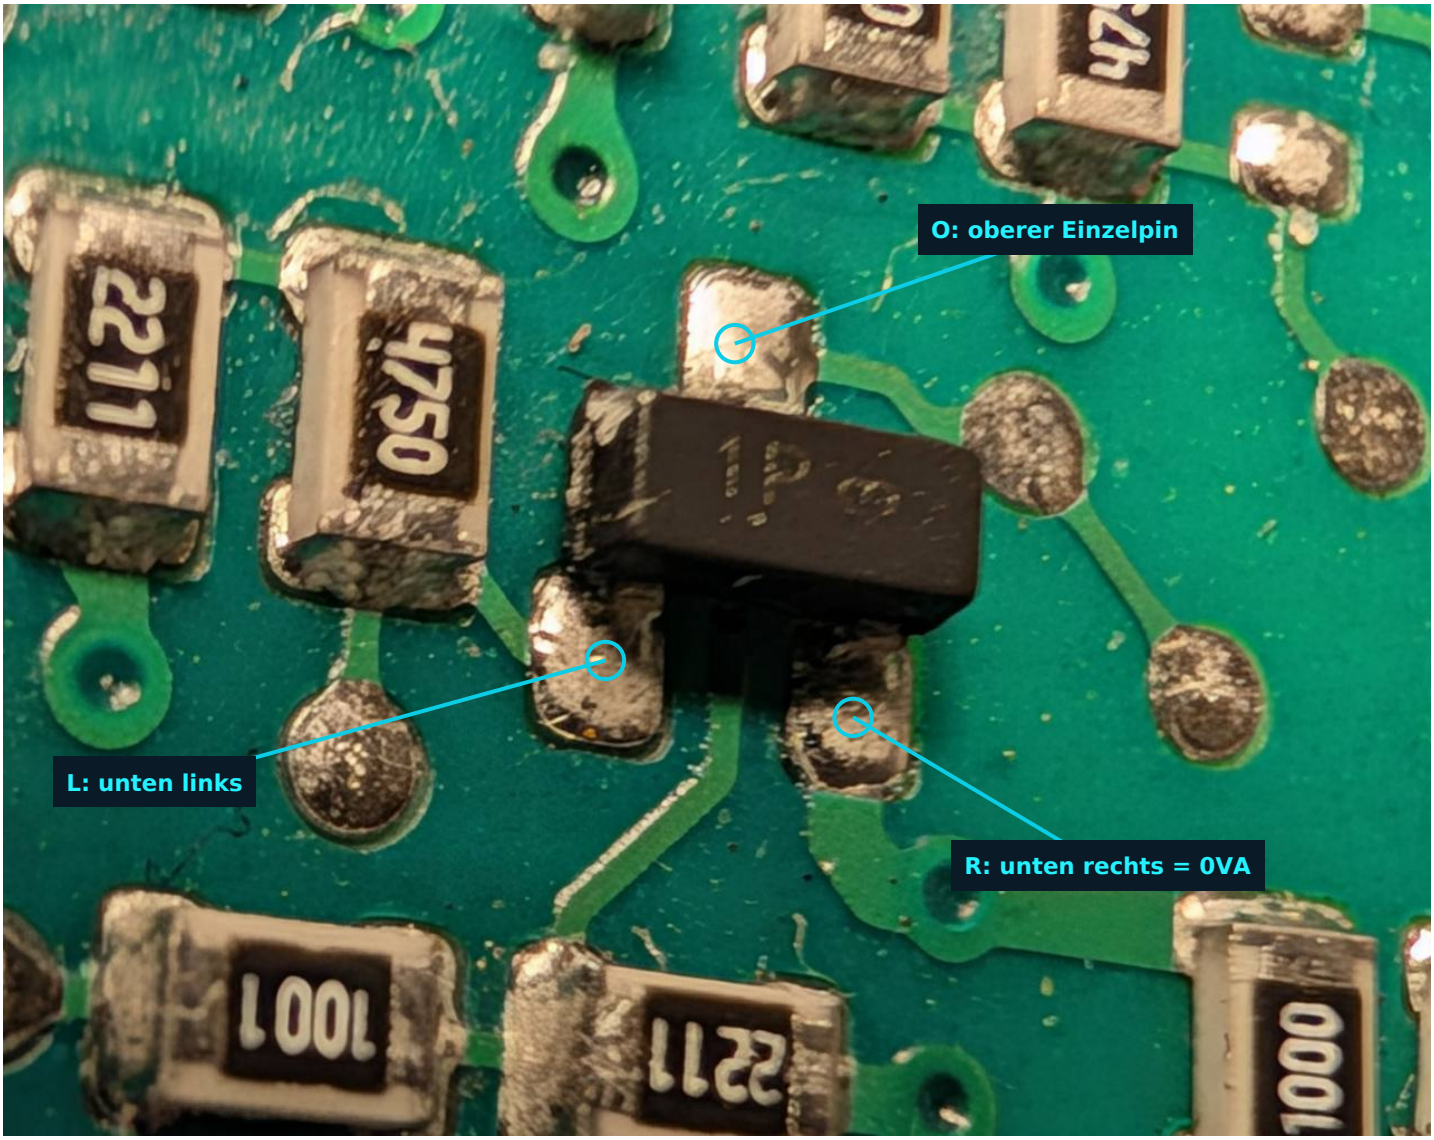

Gesichert [M]

O → linke R2211-Kappe: 0 Ω. R → 0VA: 0 Ω beidseitig. Treiberkontakt C → rechte R2211-Kappe: 0 Ω.

Kandidat [I], noch zu prüfen

1P passt zur NPN-Familie MMBT2222A/PMBT2222A: L wäre Basis, R Emitter, O Kollektor. Zusatzzeichen und Hersteller offen.

Später: Diodenmodus

Rot L / Schwarz R, dann umpolen; Rot L / Schwarz O, dann umpolen. Vier Anzeigen in V oder OL. Bisher nicht gemessen.

Q2 / R2211 / 1P – Ergebnisse und Schluss

09.11.2026 · weitere Messungen auf später verschoben · keine Defektfeststellung

Q2C-01
R221-a (Code 2211) → +24V: 41 kΩ / 50,8 kΩ

Q2C-02
Q2-DRV.C → R221-b (Code 2211): 0 Ω

Q2C-03
Q2-1P.O → R221-a (Code 2211): 0 Ω

Q2C-04
Q2-1P.L → R221-a (Code 2211): 4,78 kΩ

Q2C-05
Q2-1P.R → R221-a (Code 2211): 3,38 kΩ

Q2C-06
Q2-1P.L → +24V: 57,5 kΩ, steigend

Q2C-07
Q2-1P.R → +24V: 37,46 kΩ

Q2C-08
Q2-1P.R → 0VA: 0 Ω / 0 Ω

Zeitverlauf

41/50,8 kΩ jeweils nach etwa 20 s, vorher niedriger und ansteigend. 57,5 kΩ ebenfalls steigend, aber ohne Zeitangabe. Fehlende Gegenrichtungen bleiben offen.

Betriebsbeobachtung

Gehäuselüfter an P400 läuft laut Nutzer beim Boot und insbesondere beim Fehlstart deutlich hörbar an. Vollständiger Ausfall dieses Zweigs dadurch weniger wahrscheinlich; keine gemessene Spannung oder Treiberfreigabe.

Korrigierte Arbeitshypothese

Der R2211-Zweig ist keine nachgewiesene positive Versorgung zu C. Unter NPN-Annahme ist ein gesteuerter Ableit-/Belastungszweig gegen Masse plausibel. Funktion und Fehlerursache bleiben offen.

Fortsetzung

Nur der Diodentest L→R und L→O, jeweils umgepolt, ist als nächster Schritt geplant. Noch keine Ergebnisse dafür. Rohangaben und Quellen im gleichnamigen Markdownbericht.
